



COMUNE DI ROMA

# ASILO NIDO "GIUCOLANDIA"

VIA MONTECASSIANO, 72 – 00131 ROMA



## PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: *PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO – 1° STRALCIO*

COMMITTENTE: *COMUNE DI ROMA*

PROGETTISTA: *Ing. GIUSEPPE QUATTROCCHI  
Via G. Garibaldi n°272, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto  
Tel. 090.970 2276 / +39 339.247 1918 – email: quattrocchig@tiscali.it*


### ELENCO ALLEGATI

1. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
2. RELAZIONE TECNICA
3. ELENCO PREZZI UNITARI
4. COMPUTO METRICO E STIMA INCIDENZA MANODOPERA
5. ANALISI PREZZI
6. **CRONOPROGRAMMA E DIAGRAMMA DI GANTT**
7. PIANO DI MANUTENZIONE
8. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
9. FASCICOLO DELL'OPERA
10. PIANTE E SEZIONI EDIFICIO ESISTENTE
11. PIANTE COMPARTIMENTAZIONE, USCITE DI SICUREZZA E SEZIONI
12. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
13. RELAZIONE DIMENSIONAMENTO APERTURE DI AERAZIONE/VENTILAZIONE LOC. CUCINA

DATA 20.11.2017

IL PROGETTISTA

*Ing. Giuseppe Quattrocchi*





**Comune di Roma**

**Provincia di Roma**

# **Cronoprogramma di PROGETTO**

**OGGETTO:** Progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio dell'asilo " Giocolandia" di Montecassiano Roma Municipio IV - LAVORI PRIMO STRALCIO-


**COMMITTENTE:** COMUNE DI ROMA


Barcellona P.G. , 20/11/2017


Il Tecnico  
(Ing. Quattrocchi Giuseppe)

---



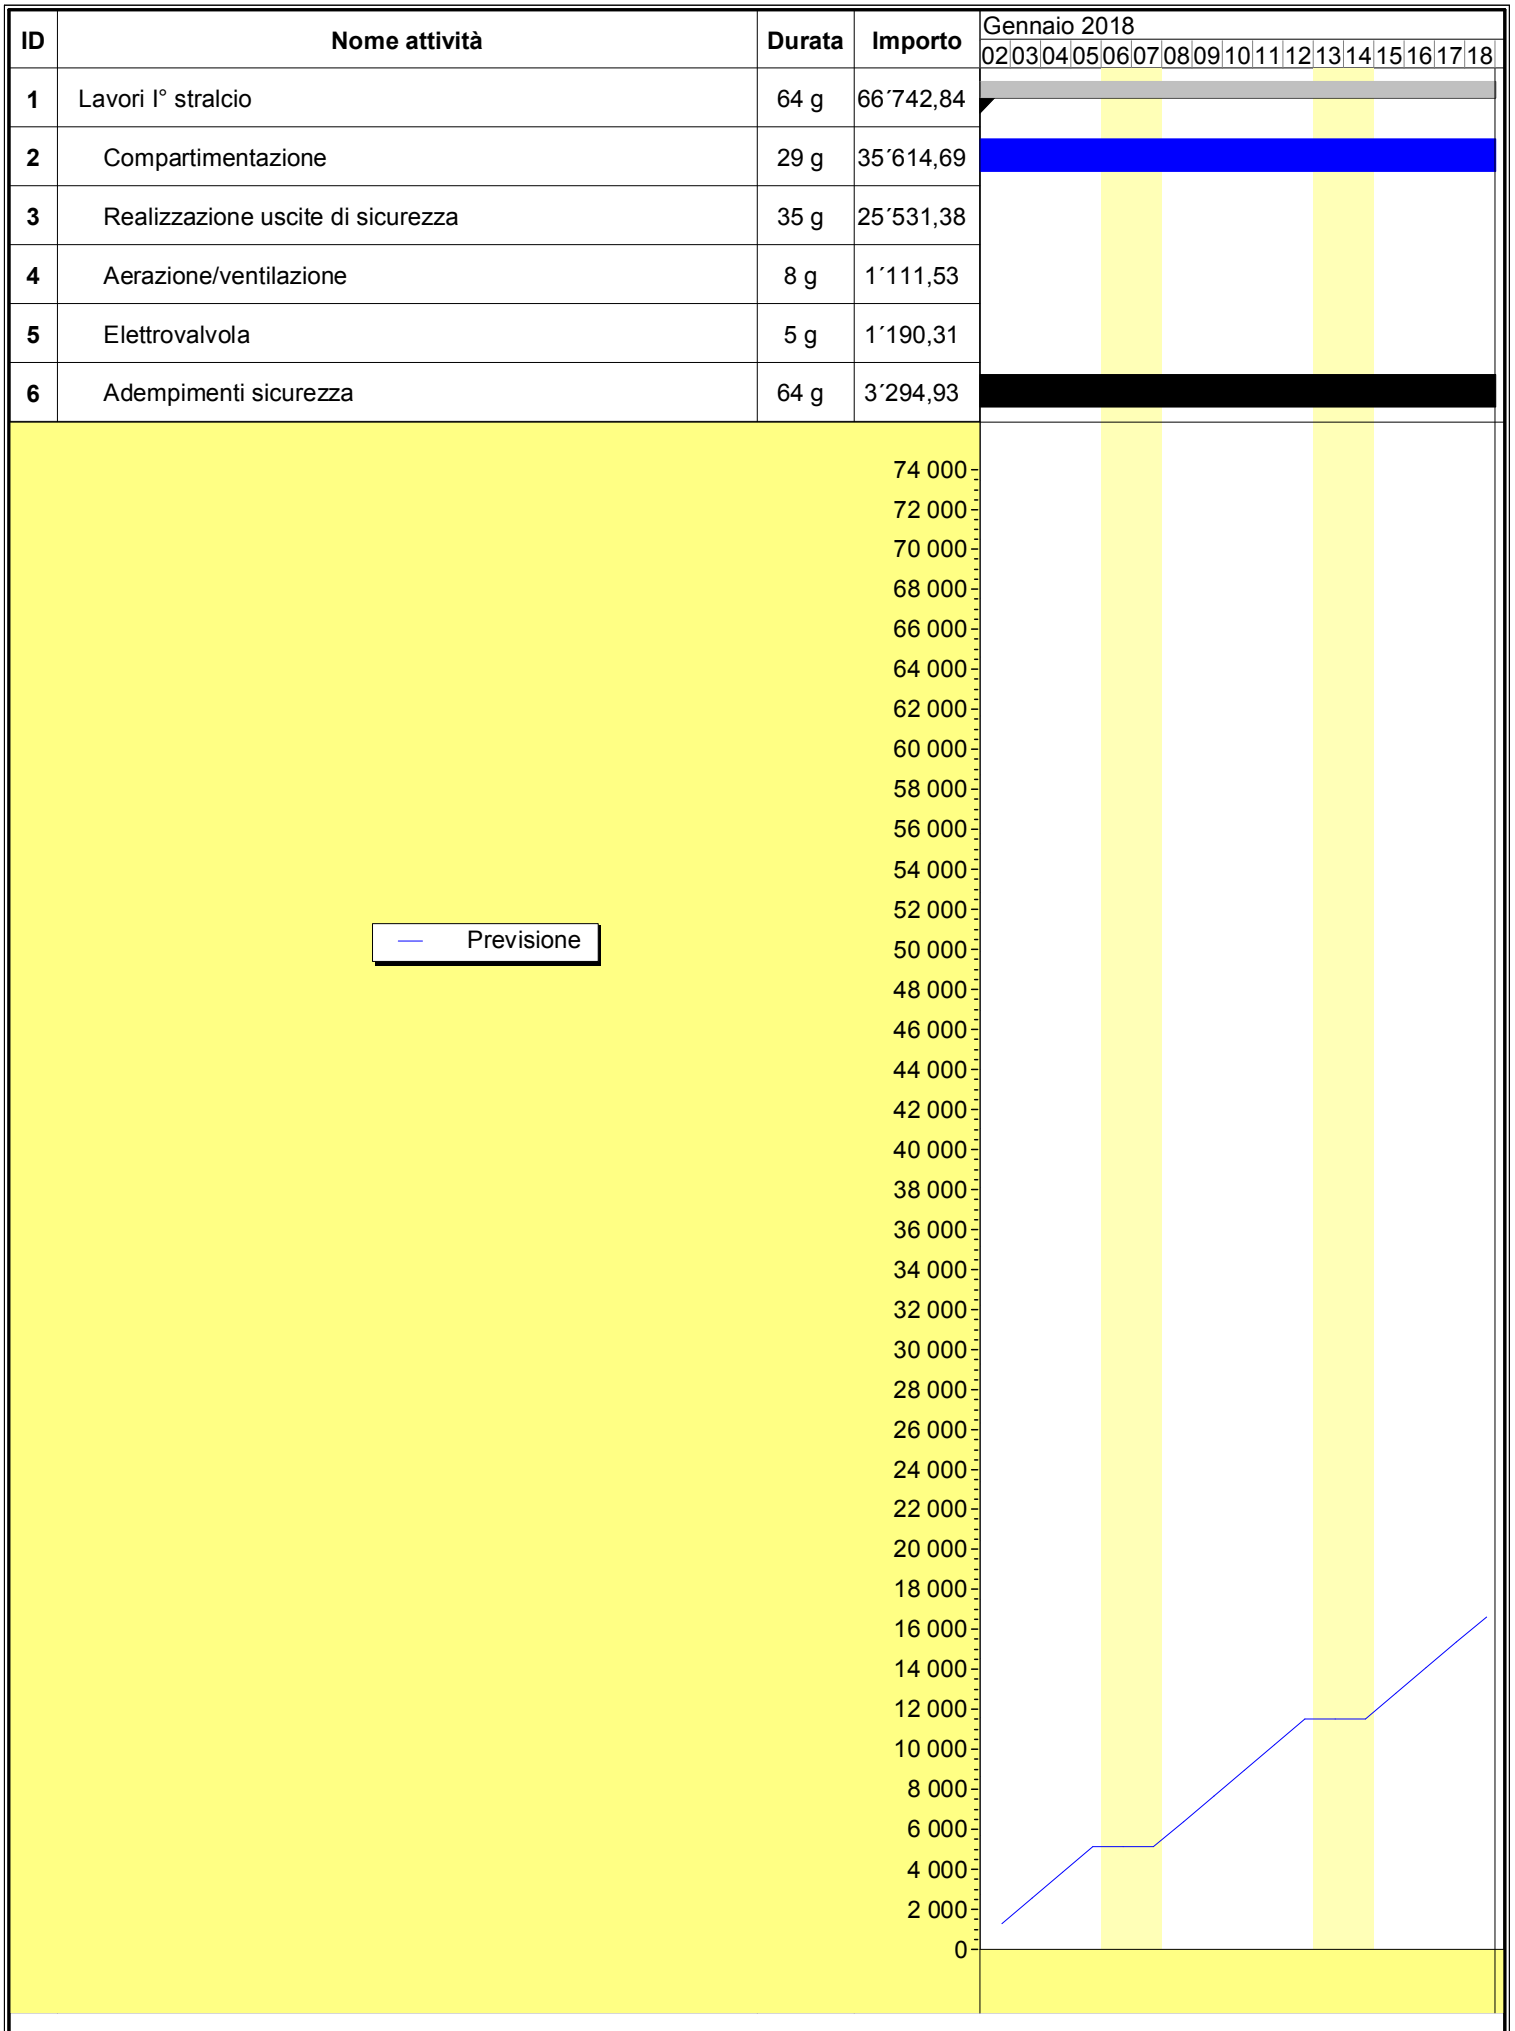

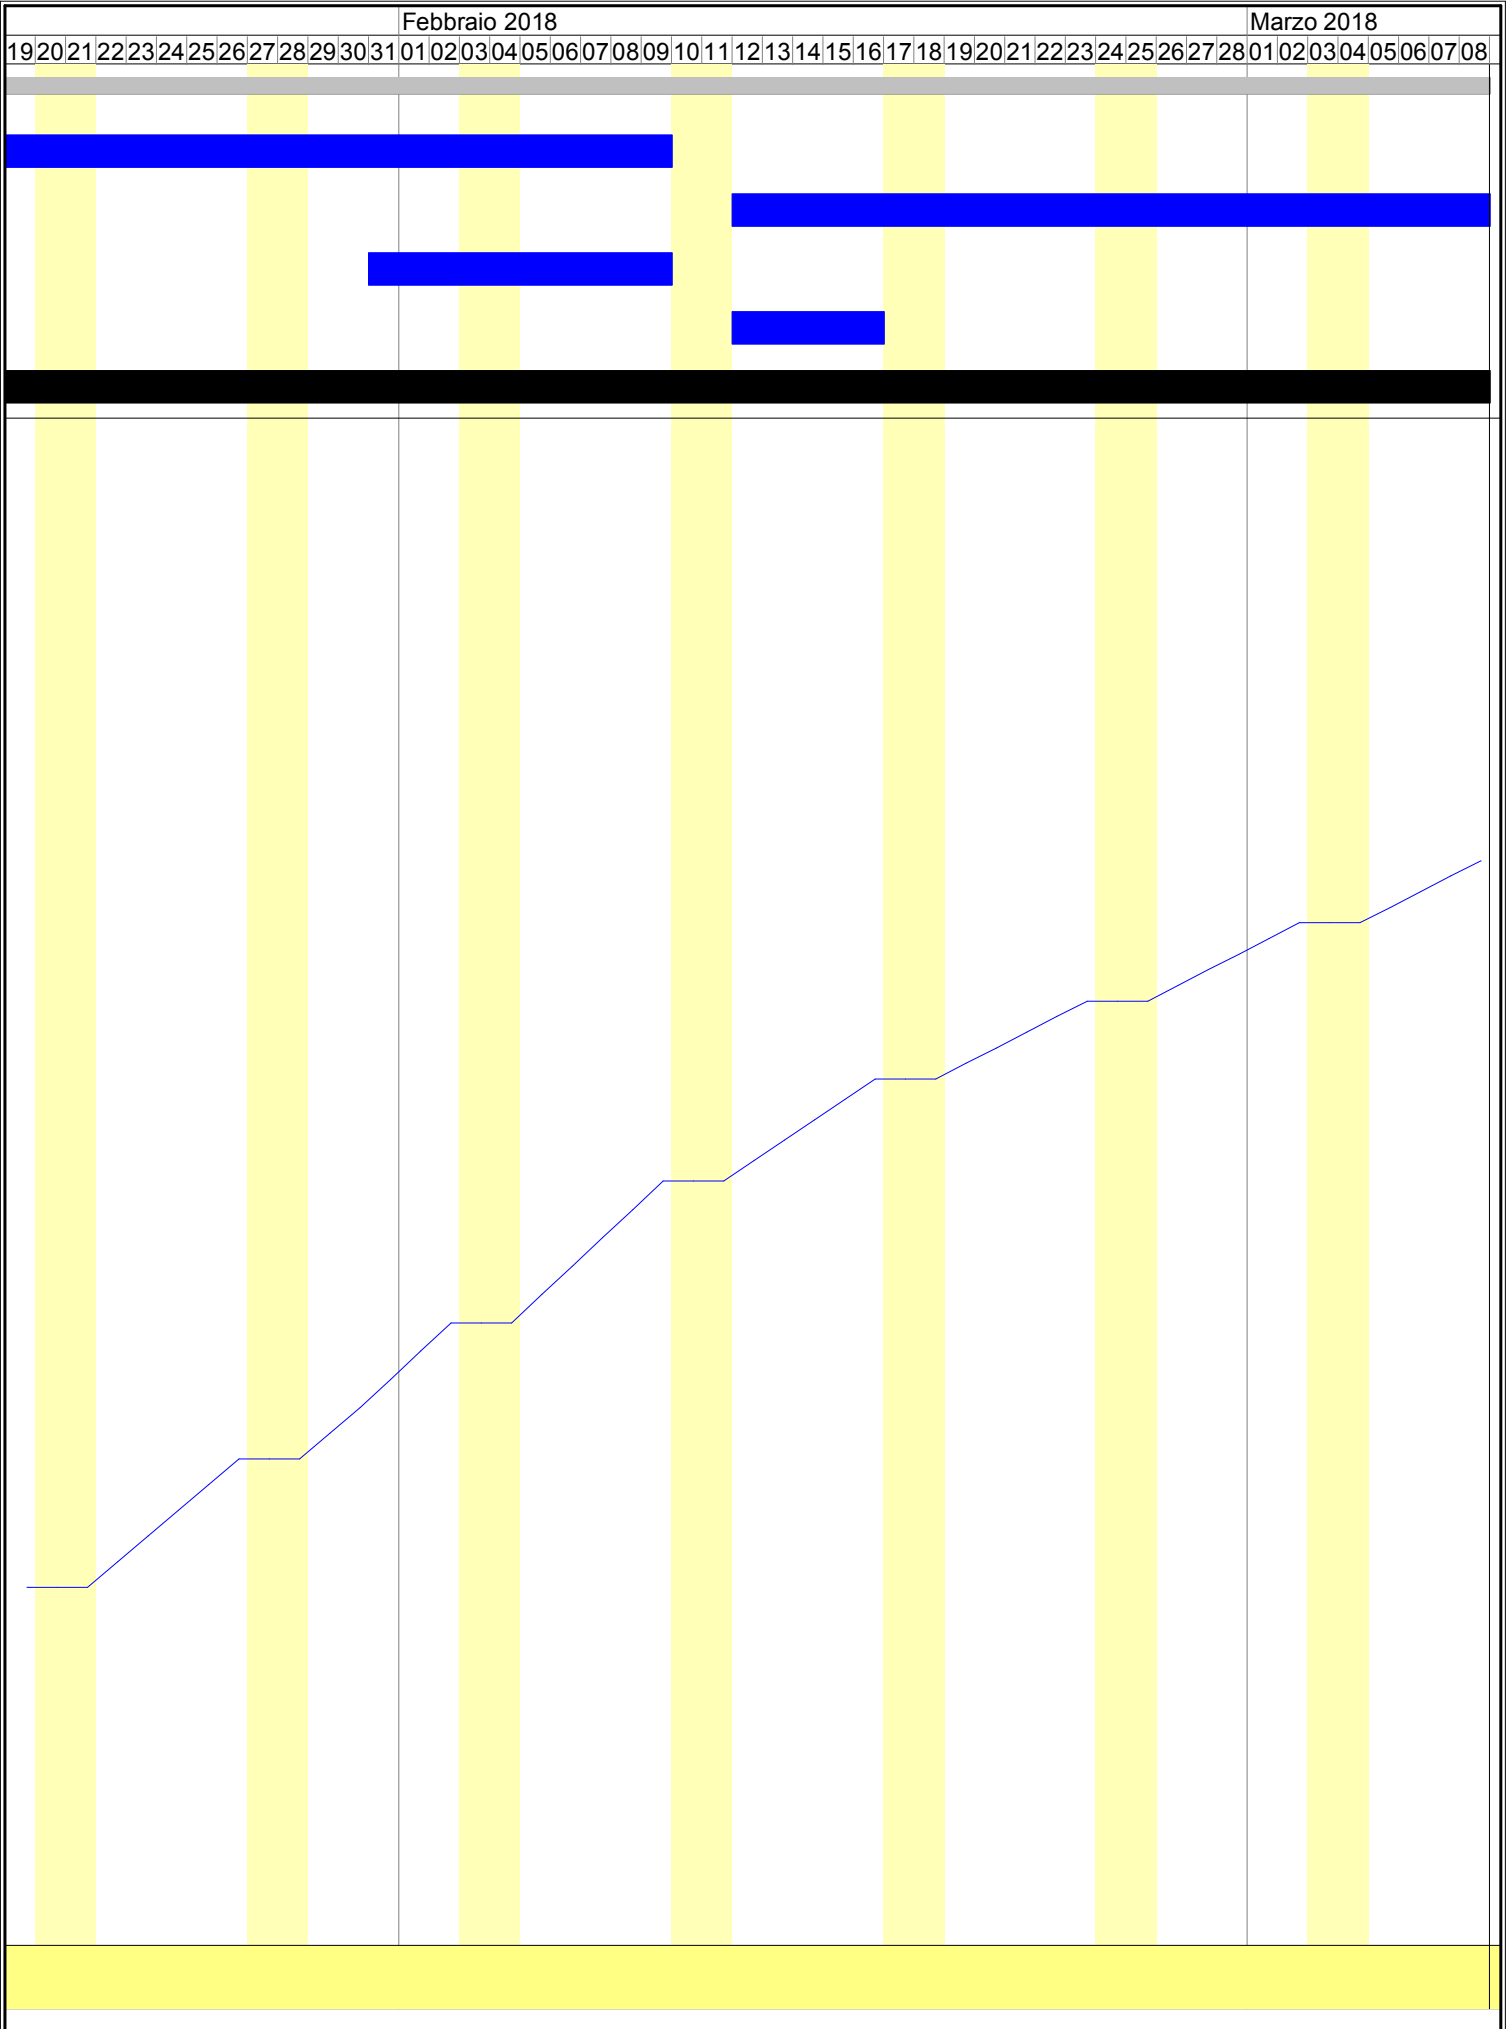

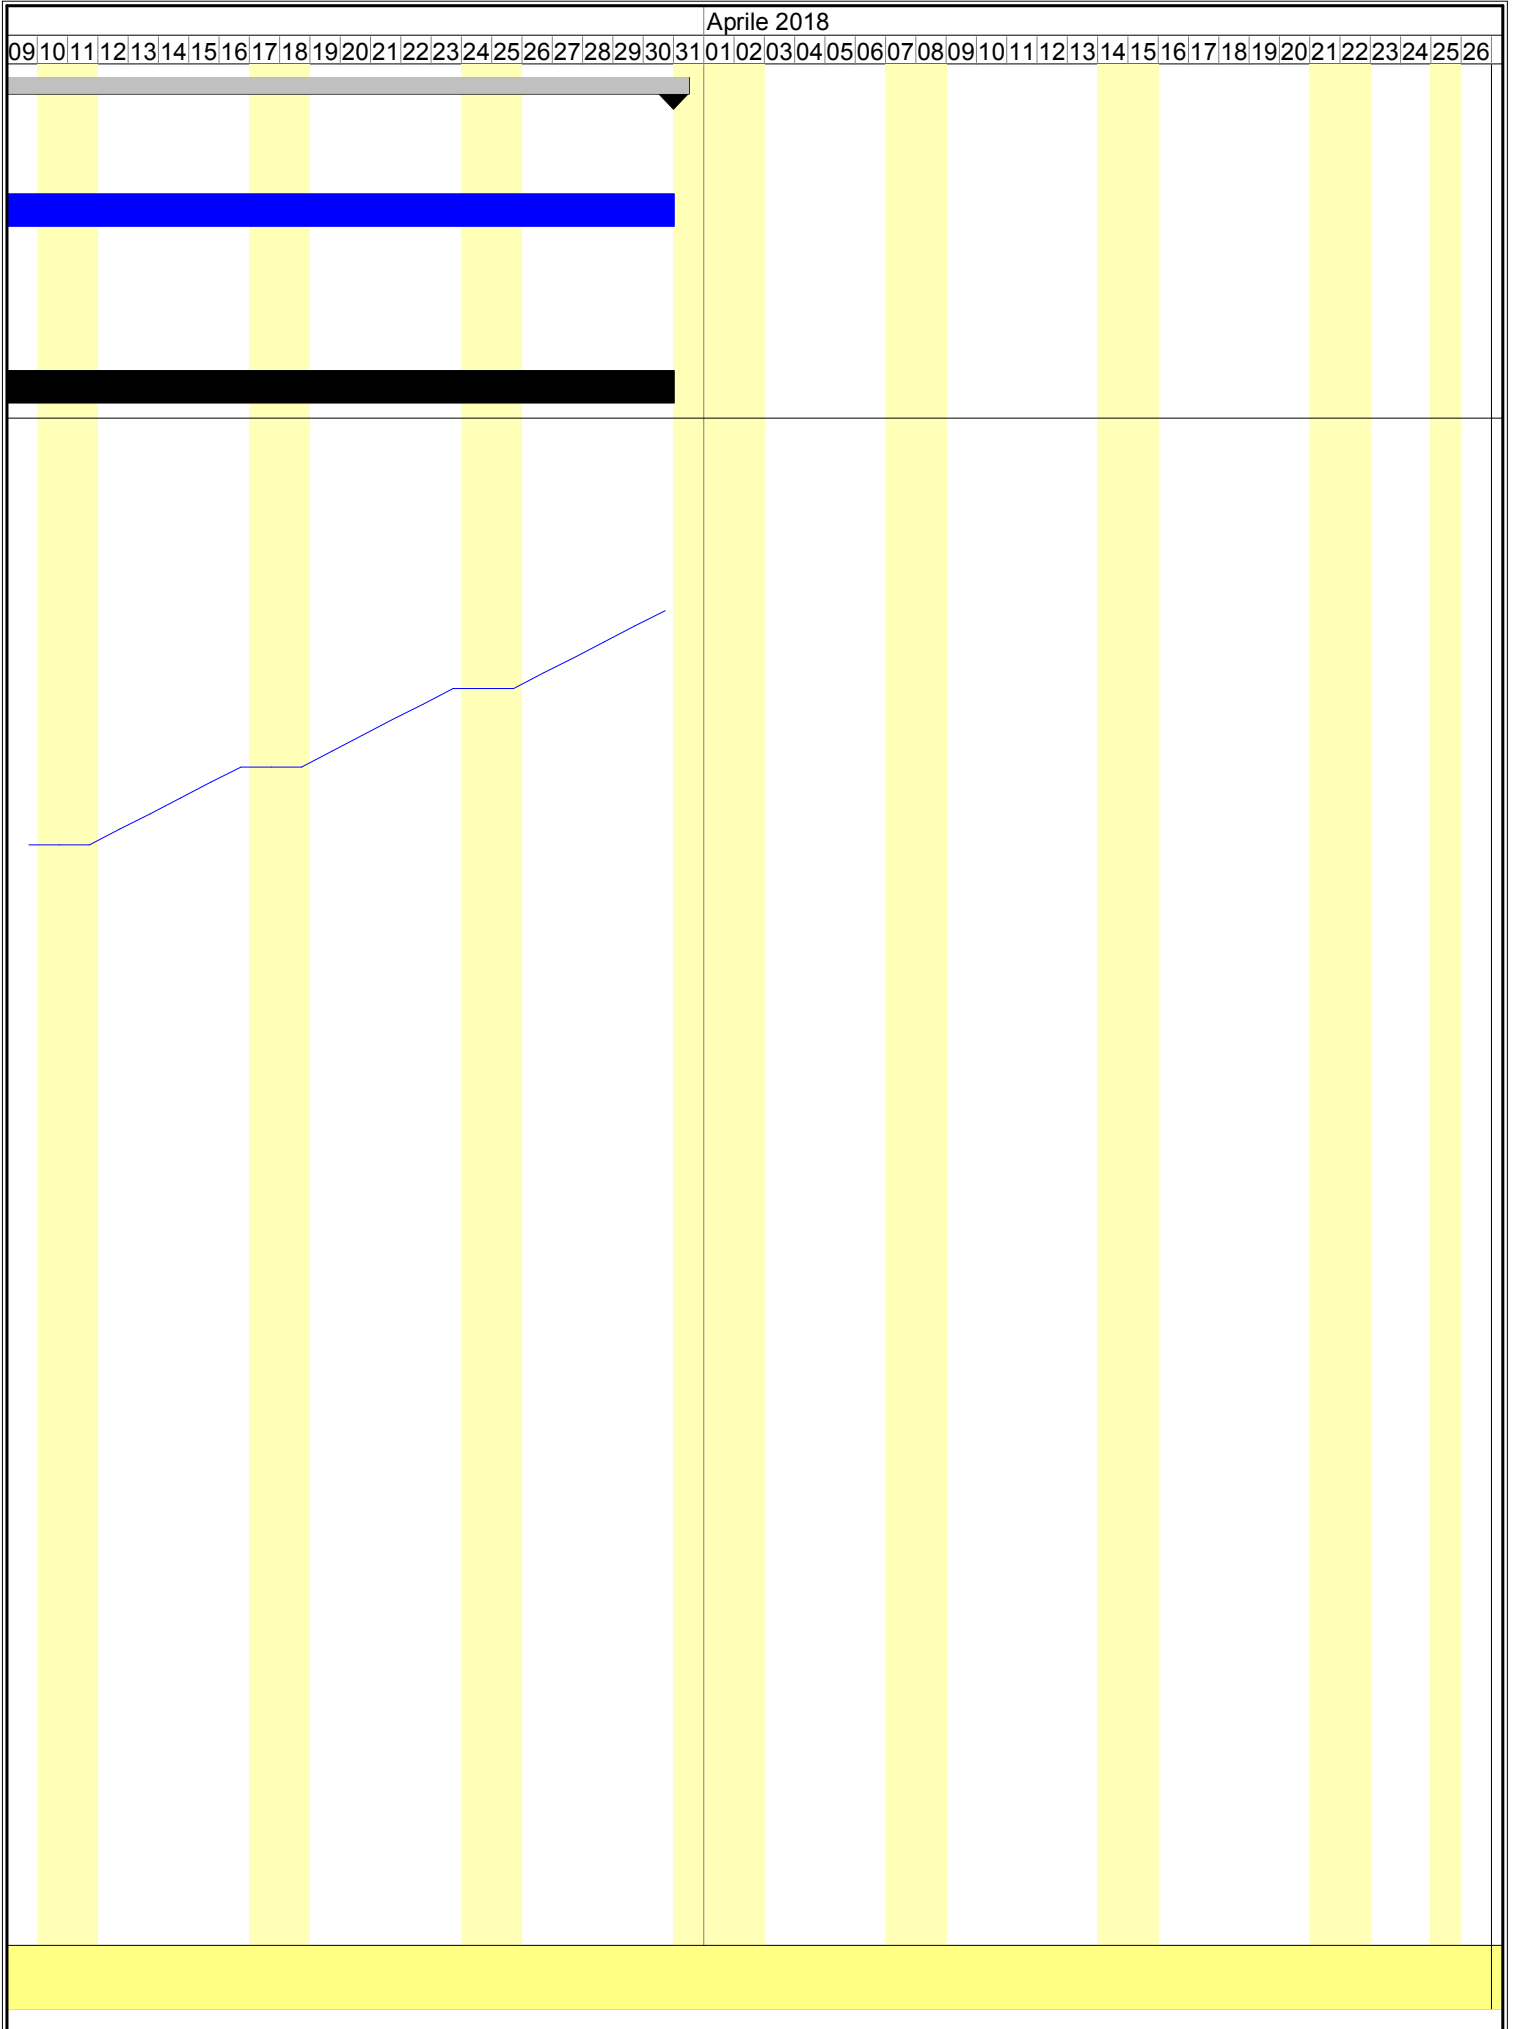

**Comune di Roma**

**Provincia di Roma**

# Tabella Attività

**OGGETTO:** Progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio dell'asilo " Giocolandia" di Montecassiano Roma Municipio IV - LAVORI PRIMO STRALCIO-

**COMMITTENTE:** COMUNE DI ROMA

Barcellona P.G. , 20/11/2017

Il Tecnico  
(Ing. Quattrocchi Giuseppe)

---



ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
<b>Lavori I° stralcio</b>	<b>66'742,84</b>	<b>100,000</b>	<b>02/01/2018</b>	<b>30/03/2018</b>	<b>64</b>	<b>88</b>
* Compartimentazione	35'614,69	53,361	02/01/2018	09/02/2018	29	39
* Realizzazione uscite di sicurezza	25'531,38	38,253	12/02/2018	30/03/2018	35	47
* Aerazione/ventilazione	1'111,53	1,665	31/01/2018	09/02/2018	8	10
* Elettrovalvola	1'190,31	1,783	12/02/2018	16/02/2018	5	5
* Adempimenti sicurezza	3'294,93	4,937	02/01/2018	30/03/2018	64	88
<p>Barcellona P.G. , 20/11/2017</p> <p style="text-align: center;"><b>Tecnico</b> Ing. Quattrocchi Giuseppe</p>						

**Comune di Roma**

**Provincia di Roma**

# Tabella Date e Importi

**OGGETTO:** Progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento antincendio dell'asilo " Giocolandia" di Montecassiano Roma Municipio IV - LAVORI PRIMO STRALCIO-

**COMMITTENTE:** COMUNE DI ROMA

Barcellona P.G. , 20/11/2017

Il Tecnico  
(Ing. Quattrocchi Giuseppe)

---

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
02/01/2018	1'279,58	1'279,58	1,917
03/01/2018	1'279,58	2'559,15	3,834
04/01/2018	1'279,58	3'838,73	5,752
05/01/2018	1'279,58	5'118,30	7,669
08/01/2018	1'279,58	6'397,88	9,586
09/01/2018	1'279,58	7'677,46	11,503
10/01/2018	1'279,58	8'957,03	13,420
11/01/2018	1'279,58	10'236,61	15,337
12/01/2018	1'279,58	11'516,18	17,255
15/01/2018	1'279,58	12'795,76	19,172
16/01/2018	1'279,58	14'075,34	21,089
17/01/2018	1'279,58	15'354,91	23,006
18/01/2018	1'279,58	16'634,49	24,923
19/01/2018	1'279,58	17'914,06	26,840
22/01/2018	1'279,58	19'193,64	28,758
23/01/2018	1'279,58	20'473,22	30,675
24/01/2018	1'279,58	21'752,79	32,592
25/01/2018	1'279,58	23'032,37	34,509
26/01/2018	1'279,58	24'311,94	36,426
29/01/2018	1'279,58	25'591,52	38,343
30/01/2018	1'279,58	26'871,10	40,261
31/01/2018	1'418,52	28'289,61	42,386
01/02/2018	1'418,52	29'708,13	44,511
02/02/2018	1'418,52	31'126,65	46,637
05/02/2018	1'418,52	32'545,17	48,762
06/02/2018	1'418,52	33'963,68	50,887
07/02/2018	1'418,52	35'382,20	53,013
08/02/2018	1'418,52	36'800,72	55,138
09/02/2018	1'418,51	38'219,23	57,263
12/02/2018	1'019,01	39'238,24	58,790
13/02/2018	1'019,01	40'257,26	60,317
14/02/2018	1'019,01	41'276,27	61,844
15/02/2018	1'019,01	42'295,28	63,371
16/02/2018	1'019,01	43'314,30	64,897
19/02/2018	780,95	44'095,25	66,067
20/02/2018	780,95	44'876,20	67,237
21/02/2018	780,95	45'657,15	68,408
22/02/2018	780,95	46'438,10	69,578
23/02/2018	780,95	47'219,05	70,748
26/02/2018	780,95	48'000,00	71,918
27/02/2018	780,95	48'780,95	73,088
28/02/2018	780,95	49'561,91	74,258
01/03/2018	780,95	50'342,86	75,428
02/03/2018	780,95	51'123,81	76,598
05/03/2018	780,95	51'904,76	77,768
06/03/2018	780,95	52'685,71	78,938
07/03/2018	780,95	53'466,66	80,108
08/03/2018	780,95	54'247,61	81,279
09/03/2018	780,95	55'028,56	82,449
12/03/2018	780,95	55'809,52	83,619
13/03/2018	780,95	56'590,47	84,789
14/03/2018	780,95	57'371,42	85,959
15/03/2018	780,95	58'152,37	87,129
16/03/2018	780,95	58'933,32	88,299
19/03/2018	780,95	59'714,27	89,469
20/03/2018	780,95	60'495,22	90,639
21/03/2018	780,95	61'276,18	91,809
22/03/2018	780,95	62'057,13	92,979
23/03/2018	780,95	62'838,08	94,150
26/03/2018	780,95	63'619,03	95,320
27/03/2018	780,95	64'399,98	96,490
28/03/2018	780,95	65'180,93	97,660
29/03/2018	780,95	65'961,88	98,830

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
30/03/2018  Barcellona P.G. , 20/11/2017  <b>Tecnico</b> Ing. Quattrocchi Giuseppe	780,95	66'742,83	100,000
