


ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione "Gestione Territoriale Ambientale e del verde"



LAVORI: Riqualficazione ambientale e vegetazionale Ville Storiche – Parco Nemorense.
CUP J85118000650004 - CIG 7718291738

STAZIONE APPALTANTE: Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale

IMPRESA: SO.GEN.A.P. S.r.l., Viale Anicio Gallo, 150 – Roma — C.F./P.I. 07581741001

CONTRATTO: Doc. di Stipula M.E.P.A. del 06/09/2019

IMPORTO CONTRATTUALE: € 245.875,42 + I.V.A.

VERBALE DI CONSTATAZIONE

Art. 5 c.1 D.M. 49/2018

- **Vista** la nota dell'Impresa del 23/06/2020 con la quale, informava l'ufficio dell'avvenuta ultimazione dei lavori, per la parte non interessata dal verbale di sospensione parziale prot. QL 41623 del 18/06/2020;
- **Vista** la nota di convocazione dell'Impresa prot. QL 43368 del 24/06/2020, presso il sito, per l'accertamento dell'effettiva ultimazione dei lavori medesimi;
- **Considerato**, che il termine di ultimazione lavori scade il giorno **26/06/2020**, e che tale termine non può essere considerato definitivo, in quanto una parte dei lavori sono oggetto di sospensione parziale;

tutto ciò premesso,

l'anno **Duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **Giugno**, il sottoscritto Funz. Geom. Sandro Mangiavacchi, in qualità di Direttore dei lavori, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto, dove sono presenti:

- Arch. Nicoletta Scottoni, in qualità di Responsabile del Procedimento incaricato;
- Arch. Edoardo Sborchia, in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione incaricato;
- Arch. Monica Fariello in qualità di Rappresentante legale dell'Impresa Appaltatrice;
- **Geom. CLAUDIO GROSSI (IMPRESA)**
-

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto approvato e della perizia di variante in corso di approvazione, si è proceduto a verificare la corrispondenza tra i dati degli stessi ed i lavori eseguiti. Sulla base delle verifiche eseguite in contraddittorio con l'Impresa e che hanno interessato le seguenti categorie di lavorazione:

- Pavimentazioni, opere a verde, impianto smaltimento acque, intonaci e tinteggiature, arredi ed altre minori lavorazioni,

si è constatato l'effettiva ultimazione dei lavori nell'area del parco non oggetto di sospensione.


Al riguardo, si constata la effettiva delimitazione con recinzione di cantiere dell'area oggetto di sospensione parziale (area ex AMA) che sarà ripresa successivamente allo sgombrò dei materiali di risulta da parte dell'Azienda stessa. L'area che insiste intorno al P.V.I. rimane recintata fino a nuova disposizione.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, assegna, inoltre, il termine di cinque giorni per la pulizia dell'area e lo sgombrò di tutti i materiali e attrezzature di cantiere.


Si allega planimetria dell'area.

Alle ore 13.00 si conclude il sopralluogo.
Atto redatto, letto confermato e sottoscritto.


Funz. Geom. Sandro Mangiavacchi
(Direttore dei Lavori)




Arch. Nicoletta Scottoni
(Responsabile del Procedimento)




Arch. Monica Fariello
(Impresa)



PLANIMETRIA ALLEGATA
AL VERBALE DEL 26/06/2020

 AREA OGGETTO DI SOSPENSIONE

 AREA GIOCHI ESCLUSA DALL'APPALTO

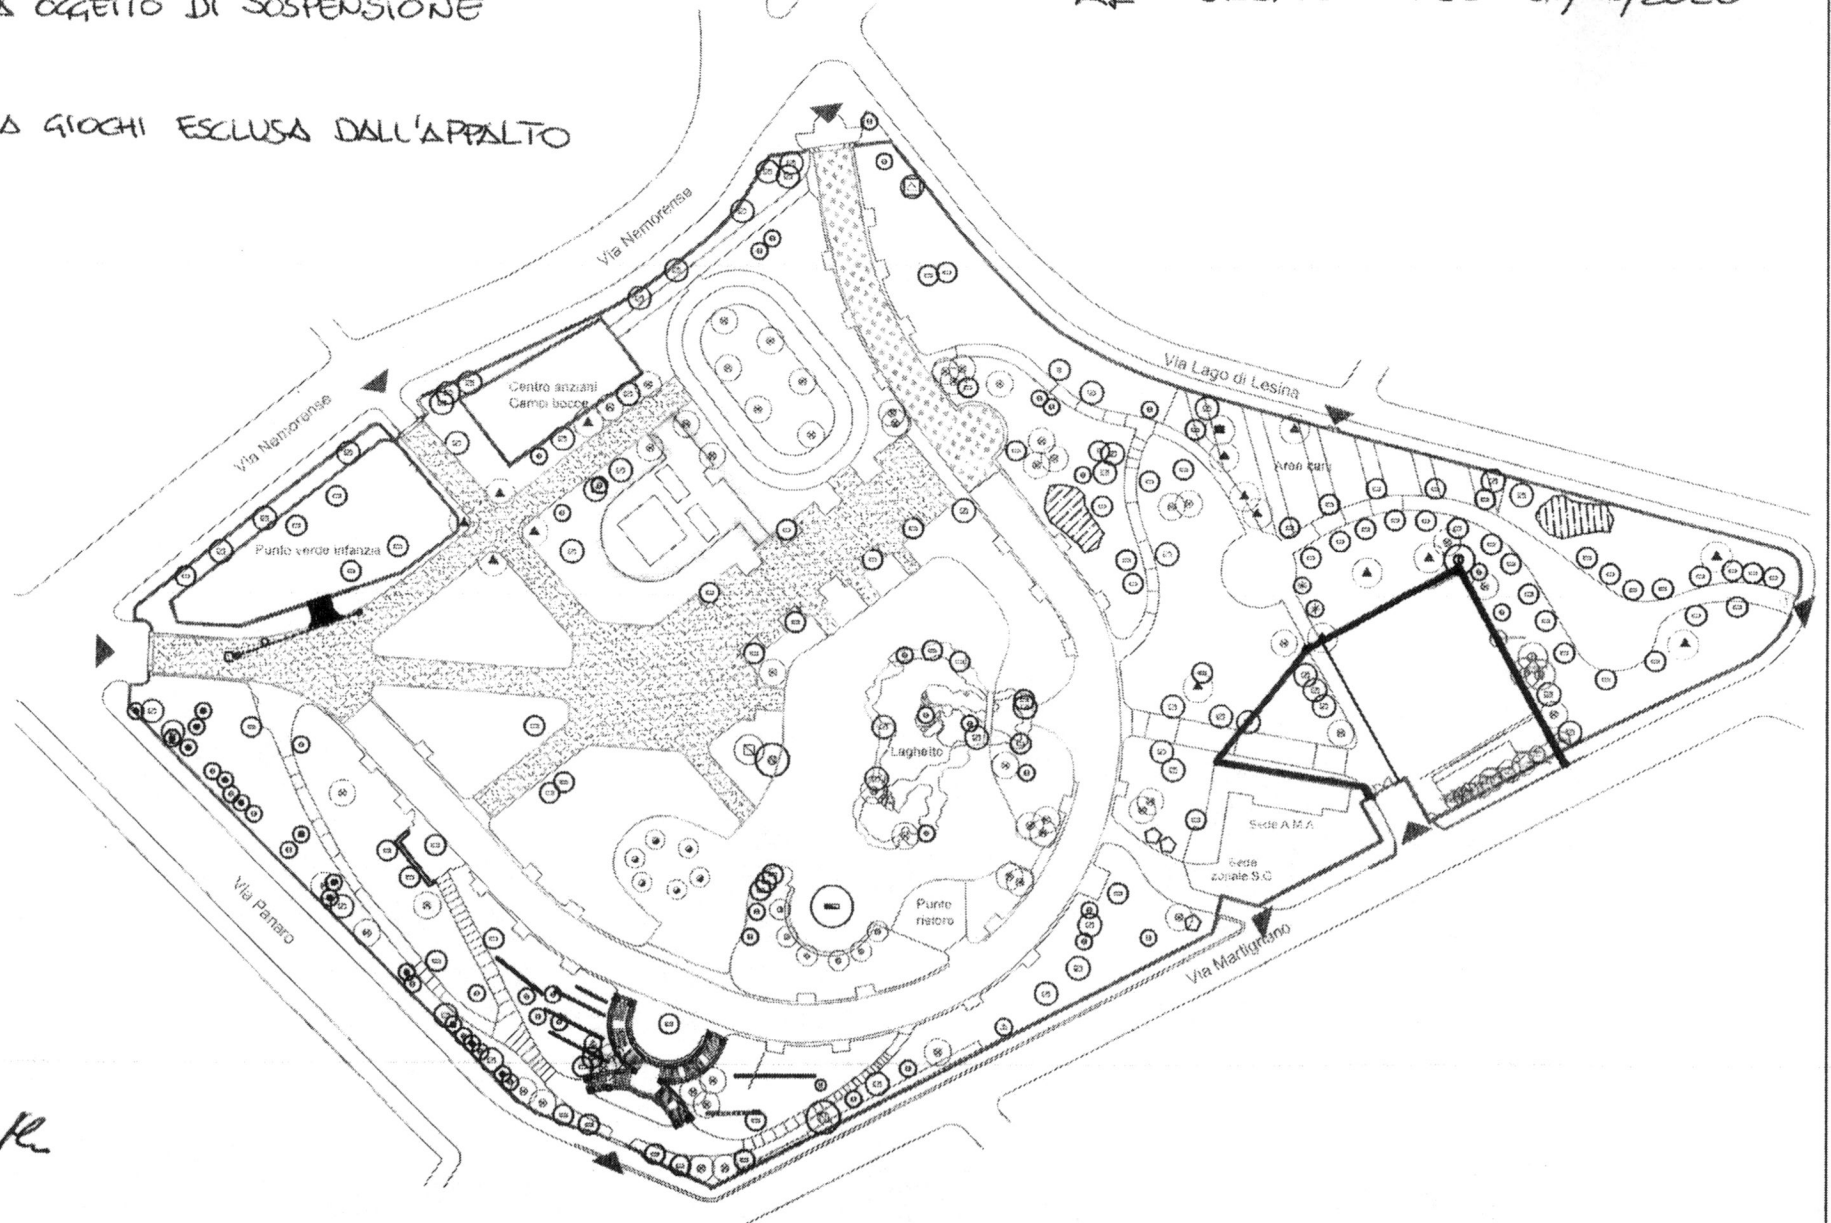

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
