

1.1 Gli obiettivi strategici di medio periodo

1.1.1 Centro storico

L'*Ambito Centro Storico* racchiude l'insieme delle strategie volte ad assicurare la riqualificazione urbana, lo sviluppo culturale e la mobilità sostenibile della Città storica di Roma Capitale attraverso:

- l'ampliamento ed il miglioramento della fruizione delle zone pedonali;
- il recupero del tessuto urbano storico;
- il restauro delle aree verdi;
- l'attuazione del Piano strategico della Mobilità sostenibile da realizzarsi tramite l'utilizzo di mezzi a trazione elettrica;
- il contenimento dell'inquinamento acustico e dell'aria.

Gli interventi programmati sono garantiti dal coinvolgimento delle seguenti strutture dell'Amministrazione capitolina: Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica; Sovrintendenza Capitolina e Dipartimento Cultura; Dipartimento Mobilità e trasporti e Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile.

I risultati raggiunti in ambito "Centro Storico", collegati agli obiettivi strategici di medio periodo, sono parzialmente in linea con quanto programmato. Le criticità riscontrate nel perseguimento di taluni obiettivi sono da ricondurre alla mancanza di fondi e alla necessità di rispettare i vincoli di natura ambientale, archeologico, storico-artistici e progettuali legati alla peculiarità del territorio che comprende il più grande centro storico del mondo tutelato dall'UNESCO. Di conseguenza, durante l'esercizio 2012, si è reso necessario modificare/rimodulare alcuni progetti.


La Fig.1.1.1.1. riporta l'andamento dello Stato di Avanzamento Lavori per obiettivi. Nell'ambito del programma per il recupero e la valorizzazione del Centro Storico, sono stati individuati 10 interventi, per 8 dei quali si evidenzia il completamento delle attività previste per il 2012. Tra questi, risultano particolarmente rilevanti:

- la riqualificazione di **Piazza Augusto Imperatore**: il progetto, scaturito da un concorso internazionale di progettazione, prevede la sistemazione architettonica del monumento e la riconfigurazione dello spazio pubblico e dell'invaso della piazza e del suo intorno urbano. Il progetto definitivo dell'opera ha ottenuto parere favorevole della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio. Sono state attivate le procedure necessarie all'indizione di una gara per la ricerca di sponsor per la realizzazione del I lotto dei lavori di restauro del Mausoleo di Augusto;
- la riqualificazione di **Piazza San Silvestro**: la piazza ora è completamente pedonalizzata, dotata di panchine e di un ampio spazio di forma ovale a disposizione per eventi vari quali manifestazioni culturali, installazioni artistiche, esposizioni e concerti. La piazza è stata inaugurata il 31 Marzo 2012;
- la sistemazione di **Piazza Fontana di Trevi** i cui lavori sono ultimati.

Il progetto di attivazione del **bike sharing** elettrico sperimentale nelle Ville storiche: al 31.12.2012 è stato attivato il *bike sharing* elettrico all'interno di Villa Ada e Villa Borghese con complessive 100 biciclette. La postazione prevista all'interno di Villa Pamphili non si è potuta attivare a causa di criticità manifestate dalla Sovrintendenza e dal Municipio XVI e la postazione prevista è stata installata a Villa Borghese.

Per la riqualificazione di **Piazza del Parlamento**, la cui cantierizzazione era prevista per il 2013, è stato redatto esclusivamente il progetto preliminare dell'opera.

Figura 1.1.1.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31 dicembre 2012 – Ambito Centro Storico

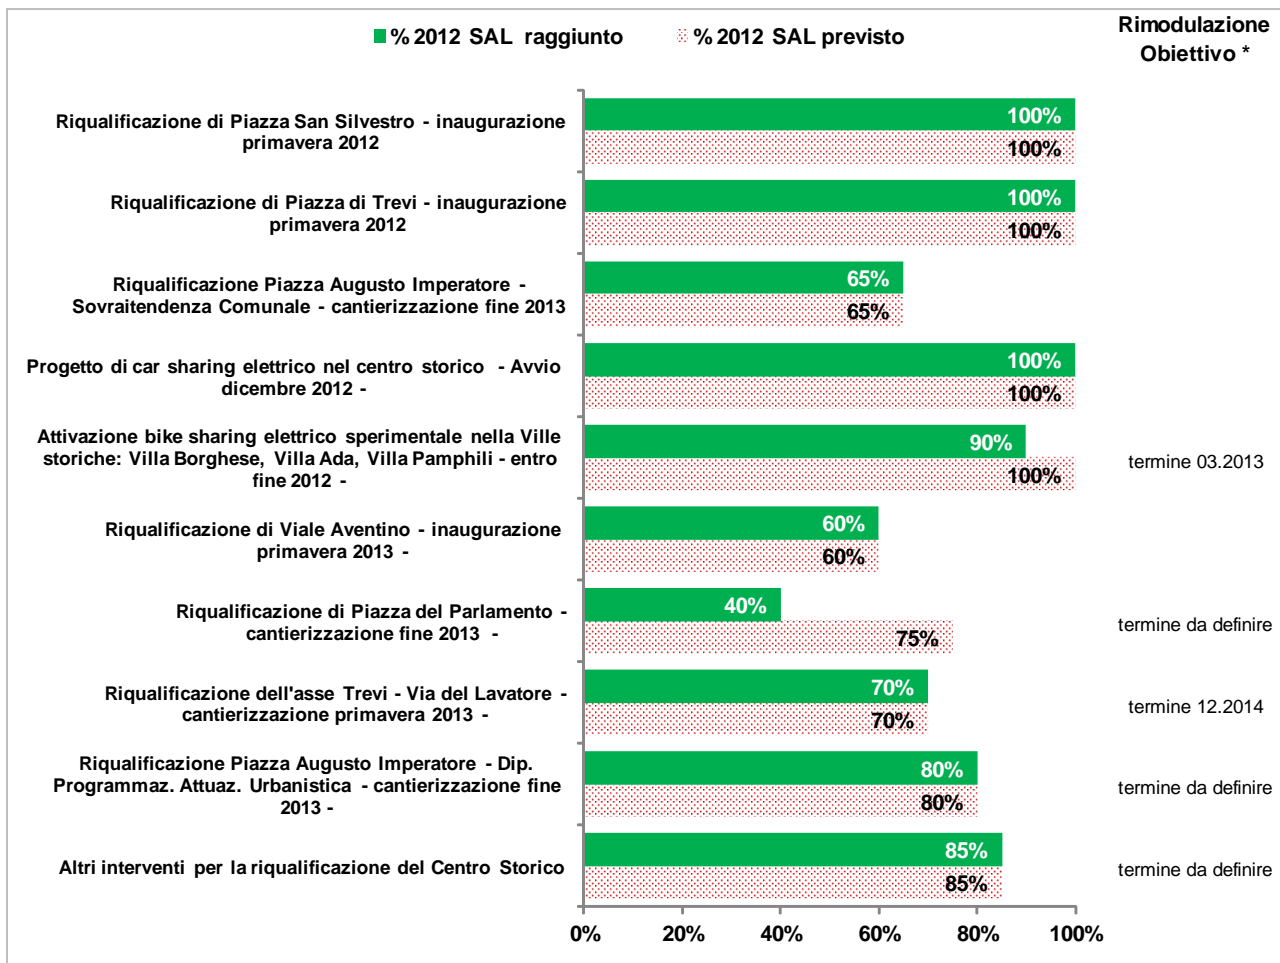

Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Elaborazione da report “Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi di fine mandato al 31/12 /2012”

* La “Rimodulazione dell’Obiettivo” evidenzia l’eventuale riallineamento del termine, della % di realizzazione o della definizione del progetto, risultanti dal monitoraggio dello stato di attuazione degli OBFM al 31/03/2013.
